

PDTIC 2012-2013

**Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Região
Secretaria de Tecnologia da Informação**

Atualização - Março/2013

Sumário

Mapa Estratégico - PETI-TRT24.....	3
Processo de trabalho.....	4
Demandas oriundas da versão anterior do PDTI.....	5
Demandas oriundas da Gestão do Portfólio de Projetos do Planejamento Estratégico de TIC do TRT24.....	10
Diagnóstico.....	11
Gráfico de cruzamento de demandas X pessoas.....	16
Planejamento das ações	18
Planejamento da execução	24



A SERVIÇO DA JUSTIÇA E DO CIDADÃO

MAPA ESTRATÉGICO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO TRT DA 24ª REGIÃO

Missão:
Fornecer soluções tecnológicas e serviços para viabilizar a eficiência do TRT24 no cumprimento de sua missão institucional.

Visão de Futuro:
Obter reconhecimento pela qualidade do fornecimento de soluções tecnológicas e serviços oferecidos aos clientes do TRT24.

Valores

Qualidade dos serviços

Adotar as melhores práticas de gerência de serviços de TIC

Transparência

Facilitar o acesso a informação

Segurança da informação

Garantir a segurança da informação


Garantir a disponibilidade das soluções e serviços

Capacitação

Desenvolver as capacidades gerenciais

Atualizar continuamente as capacidades técnicas

Processo de trabalho para confecção do PDTI:

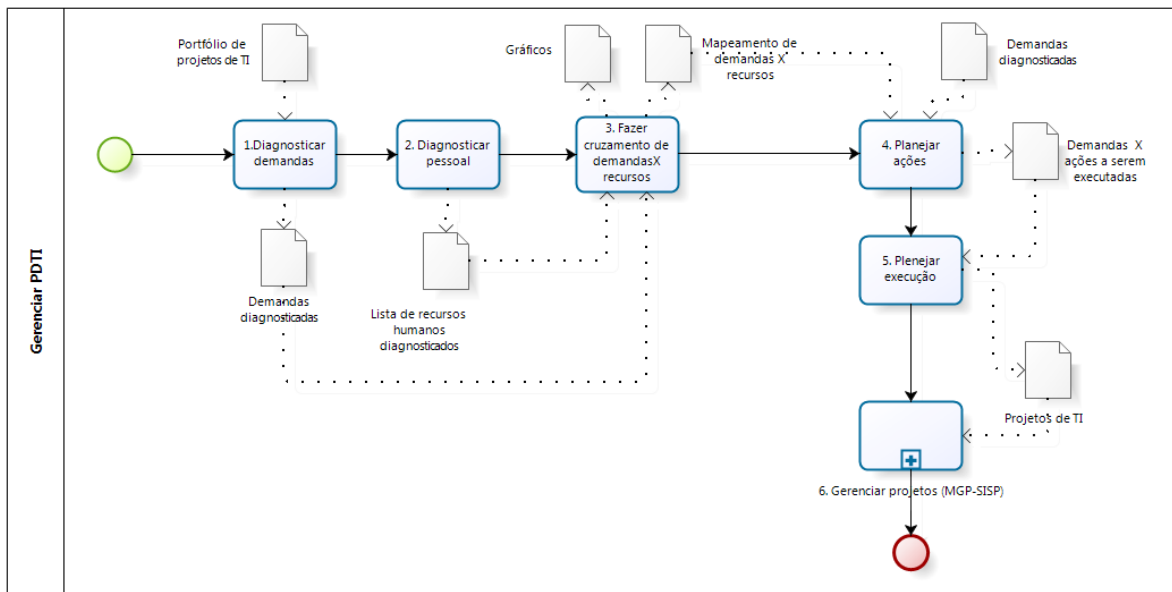

Demandas oriundas da versão anterior do PDTIC

	Id	Ação	Prioridade	Prazos		Status
				Início	Conclusão	
Implantar PO1	1.1	Realizar RAEs	1	Fev/2012	Dez/2013	Em andamento (no prazo)
	1.2	Realizar análise de riscos	1	Jan/2012	Jun/2012	Realizado
	1.3	Implantar indicadores de gestão de processos	1	Jan/2012	Dez/2012	Realizado
Implantar PO10	1.4	Implantar a MGP-TRT24	1	Jan/2012	Abril/2012	Realizado
	1.5	Implantar o software de gerência de projetos GpWeb	1	Jan/2012	Abril/2012	Realizado
	1.6	Realizar treinamentos em gestão de projetos	1	Jul/2012	Dez/2012	Realizado
	1.7	Implantar a gerência de portfólio	1	Jan/2012	Mar/2012	Realizado
Implantar DS4	1.8	Elaborar e implantar a Política de Continuidade de Negócios	1	Jan/2012	Abril/2012	Realizado
	1.9	Elaborar os planos de recuperação de desastres e contingência de TI	1	Jan/2012	Abril/2012	Realizado
	1.10	Elaborar os planos de backup e retenção de dados	1	Jan/2012	Abril/2012	Realizado
	1.11	Elaborar os planos de testes e restauração	1	Jan/2012	Abril/2012	Realizado
	1.12	Elaborar os planos de comunicação do processo de continuidade de negócios	1	Jan/2012	Abril/2012	Realizado
Implantar DS8	1.13	Elaborar a Política do Acordo de Nível de Serviços de TI	1	Jan/2012	Jun/2012	Realizado
	1.14	Elaborar o plano de comunicação do processo de gerência de central de serviços e incidentes	1	Jan/2012	Jun/2012	Em andamento (fora do prazo)

Implantar processos ITIL	2.1	Mapear o processo, definir política e implantar sistema de controle de incidentes	2	Jan/2012	Abril/2012	Realizado
	2.2	Mapear o processo, definir política e implantar sistema de controle de problemas	2	Jan/2012	Abril/2012	Realizado
	2.3	Mapear o processo, definir política e implantar sistema de controle de requisição	2	Jan/2012	Abril/2012	Realizado
	2.4	Mapear o processo, definir política e implantar sistema de central de serviços	2	Jan/2012	Dez/2012	Realizado
	2.5	Mapear o processo, definir política e implantar sistema de controle de mudanças	2	Jun/2012	Dez/2012	Realizado
	2.6	Mapear o processo, definir política e implantar sistema de controle de liberação	2	Out/2012	Jun/2013	Em andamento (fora do prazo)
	2.7	Mapear o processo, definir política e implantar sistema de controle de fornecedor	2	Out/2012	Jun/2013	Em andamento (fora do prazo)
Capacitar gerentes	3.1	Elaborar projeto	3	Jan/2012	Abril/2012	Realizado
	3.2	Realizar treinamentos	3	Jun/2012	Jun/2013	Em andamento (no prazo)
Contratar Central de Serviços	4.1	Elaborar o projeto	4	Jan/2012	Jun/2012	Em andamento (fora do prazo)
	4.2	Realizar a contratação	4	Jun/2012	Dez/2012	
	4.3	Implantar o serviço	4	Jan/2013	Jun/2013	
Atualizar PCN	5.1	Fazer análises de risco de ativos de TI	5	Jan/2012	Mar/2012	Realizado
	5.2	Elaborar a minuta da política	5	Jan/2012	Abril/2012	Realizado
	5.3	Submeter a política ao ctSeg	5	Abril/2012	Abril/2012	Realizado

Capacitar técnicos	6.1	Elaborar projeto	6	Jan/2012	Abril/2012	Realizado
	6.2	Realizar treinamentos	6	Jun/2012	Jun/2013	Em andamento (no prazo)
Instalar salas técnicas no interior	7.1	Fazer diagnóstico da situação atual	1	Jan/2012	Jun/2012	Realizado
	7.2	Conferir projetos de construção em andamento	1	Mar/2012	Abril/2012	Realizado
	7.3	Definir requisitos mínimos de segurança	1	Mar/2012	Abril/2012	Realizado
	7.4	Elaborar projeto	1	Jul/2012	Agosto/2012	Em andamento (fora do prazo)
Atualizar 1/3 de equipamentos por ano	8.1	Elaborar minuta de termo de referência	2	Jan/2012	Fev/2012	Realizado
			2	Jan/2013	Fev/2013	Realizado
	8.2	Realizar a aquisição	2	Fev/2012	Out/2012	Realizado
			2	Fev/2013	Out/2013	Realizado
	8.3	Distribuir os equipamentos	2	Out/2012	Dez/2012	Realizado
			2	Out/2013	Dez/2013	Em andamento (no prazo)
Implantar PJe em 40% das varas	9.1	Elaborar o projeto	1	Jun/2012	Agosto/2012	Realizado
	9.2	Implantar o sistema	1	Jul/2012	Dez/2013	Em andamento (no prazo)
Substituir BE 2º grau	10.1	Implementar validações de regras de negócio	2	Mar/2012	Jun/2012	Realizado
	10.2	Desenvolver nova tela de lançamento de movimentos para o Judice2	2	Mar/2012	Out/2012	Realizado
Implantar consulta base CPFs/CNPJs	11.1	Desenvolver mecanismo de consulta	3	Mar/2012	Abril/2012	Realizado
	11.2	Adaptar a interface do sistema de Distribuição	3	Mar/2012	Abril/2012	Realizado

Implantar eGestão de 1º grau	12.1	Implementar as validações de regras de negócio	4	Mar/2012	Dez/2012	Realizado
	12.2	Desenvolver nova tela de lançamento de movimentos para o Judice2	4			Realizado
	12.3	Implementar as regras de captura de dados	4			Realizado
Expedir certidão negativa on-line	13.1	Elaborar projeto	5	Mar/2012	Abril/2012	Cancelado
	13.2	Desenvolver o serviço WEB	5	Maio/2012	Set/2012	Cancelado
Informatizar autorização de consignação	14.1	Definir regras de negócio	6	Fev/2012	Abril/2012	Realizado
	14.2	Implementar a interface de expedição da carta de consignação	6	Maio/2012	Jun/2012	Realizado
	14.3	Implantar o serviço	6	Jul/2012	Jul/2012	Realizado
Aprimorar GestorePAE/WEB	15.1	Concluir o módulo desktop	7	Jan/2012	Mar/2012	Realizado
	15.2	Implantar o módulo desktop	7	Mar/2012	Abril/2012	Realizado
	15.3	Concluir o módulo WEB	7	Jan/2012	Abril/2012	Realizado
	15.4	Implantar o módulo WEB	7	Maio/2012	Jun/2012	Realizado
	15.5	Implantar o processo eletrônico	7	Jul/2012	Dez/2012	Em andamento (fora do prazo)
Desenvolver SGRHWeb	16.1	Atualizar o projeto	8	Mar/2012	Abril/2012	Realizado
	16.2	Desenvolver o sistema SRHWeb	8	Mar/2012	Dez/2012	Em andamento (fora do prazo)
Resolução CNJ 121/2010	17.1	Elaborar o projeto	9	Mar/2012	Abril/2012	Interrompido
	17.2	Desenvolver o serviço WEB	9	Abril/2012	Out/2012	Interrompido (parcialmente desenvolvido)
Resolução	18.1	Elaborar o projeto	10	Jul/2012	Ago/2012	Interrompido

CNJ 125/2010	18.2	Desenvolver a aplicação	10	Ago/2012	Dez/2012	Interrompido
Implantar Guias de Pagamentos BB	19.1	Desenvolver WS de conexão	11	Jun/2012	Jun/2012	Realizado
	19.2	Adaptar o site do TRT24	11	Jul/2012	Jul/2012	Em andamento (fora do prazo)
Implantar convênio com TSE	20.1	Desenvolver gerador de XML de lista de nomes de servidores/magistrados	12	Jun/2012	Jun/2012	Realizado
	20.2	Desenvolver upload do arquivo XML de retorno para nossa base de dados	12	Jul/2012	Nov/2012	Realizado
Implantar LexML	21.1	Criar esquema de dados	13	Mar/2012	Mar/2012	Realizado
	21.2	Alterar o sistema JURIS para popular as tabelas	13	Mar/2012	Abril/2012	Realizado
	21.3	Implantar o serviço de transmissão	13	Abril/2012	Mai/2012	Realizado
Importar banco de dados Clipper	22.1	Elaborar o projeto	14	Agosto/2012	Set/2012	Realizado
	22.2	Executar a importação	14	Jan/2013	Abril/2013	Realizado
Desenvolver sistema de feriados	23.1	Elaborar o projeto	15	Jan/2013	Fev/2013	Cancelado
	23.2	Desenvolver o sistema	15	Fev/2013	Abril/2013	
	23.3	Integrar os sistemas atuais	15	Abril/2013	Dez/2013	

Demandas oriundas da Gestão do Portfólio de Projetos do Planejamento Estratégico de TIC do TRT24

Prioridade	Demandas de Governança de TI	Categoria estratégica
1	Implantar os processos P01, P10, DS4 e DS8	Eficiência Operacional
2	Capacitar os gerentes e técnicos de TIC	Capacitação
3	Implantar a política de segurança da internet	Segurança
4	Implantar o escritório de métricas de software	Eficiência operacional
5	Implantar os processos de suporte a serviços da biblioteca ITIL v3	Qualidade dos serviços

Prioridade	Demandas de Infraestrutura	Categoria estratégica
1	Implantar o sistema PJe	Infraestrutura
2	Instalar link de internet redundante	Infraestrutura Disponibilidade
3	Renovar anualmente 1/3 do parque de equipamentos	Infraestrutura
4	Instalar os novos servidores do interior	Infraestrutura
5	Instalar salas técnicas nas varas do interior	Segurança
6	Reestruturar o site backup	Infraestrutura Disponibilidade Segurança
Definir na próxima reunião do CGTIC	Implantação da rede wireless	Infraestrutura Disponibilidade

Prioridade	Demandas de Des. de software	Categoria estratégica
1	Aprimorar o sistema SGRHWEB	Infraestrutura
2	Migrar o sistema de Folha de Pagamentos para Java	Infraestrutura
3	Aprimorar o sistema eVoto (planilha de votação eletrônica para processos administrativos)	Infraestrutura
4	Informatizar rotinas de trabalho da SGP	Infraestrutura
5	Aprimorar o sistema GestorePAE/GestoreWEB	Infraestrutura
6	Substituir o boletim estatístico de 1º grau	Infraestrutura
7	Substituir o boletim estatístico de 2º grau	Infraestrutura
8	Atualizar o layout do site do TRT24	Infraestrutura Disponibilidade
9	Implantar emissão de boletos para guias de pagamento - CEF	Infraestrutura Disponibilidade
10	Desenvolver sistema para Gabinete de Saúde	Infraestrutura
11	Desenvolver aplicativos para internet móvel	Transparência

Diagnóstico

O objetivo do diagnóstico é descrever a situação atual pertinente a cada uma das demandas originárias do portfólio.
O diagnóstico não irá elencar sugestões de projetos ou linhas de ação, bem como não fará inventário de hardware, software ou serviços.

Tabelas de diagnóstico das demandas

ID	Demandas oriundas da versão anterior do PDTI	Situação atual	
N1	Implantar PO1	Realizar RAEs	Em andamento (no prazo)
N1	Implantar DS8	Elaborar o plano de comunicação do processo de gerência de central de serviços e incidentes	Aguardando evolução do processo de contratação do atendimento
N2	Implantar processos ITIL	Mapear o processo, definir política e implantar sistema de controle de liberação	Aguardando definição do processo
N2	Implantar processos ITIL	Mapear o processo, definir política e implantar sistema de controle de fornecedor	Aguardando definição do processo
N3	Capacitar gerentes	Realizar treinamentos	Em andamento (no prazo)
N4	Contratar Central de Serviços	Elaborar o projeto	Projeto em andamento TR em fase pesquisa
		Realizar a contratação	
		Implantar o serviço	
N6	Capacitar técnicos	Realizar treinamentos	Em andamento (no prazo)
N7	Instalar salas técnicas no interior	Elaborar projeto	Aguardando andamento dos projetos de construção civil das varas do interior
N8	Atualizar 1/3 de equipamentos por ano	Distribuir equipamentos	os Em andamento (no prazo)
N9	Implantar PJe em 40% das varas	Implantar o sistema	O cronograma de infraestrutura está sendo cumprido. Aguardando cronograma de implantação definido pela CPJ
N15	Aprimorar GestorePAE/WEB	Implantar o processo eletrônico	O cronograma de desenvolvimento foi cumprido. Aguardando janela de oportunidade para implantar o processo eletrônico.

N16	Desenvolver SGRHWeb	Desenvolver o sistema SRHWeb	O cronograma de implantação está previsto para junho 2013
N19	Implantar Guias de Pagamentos BB	Adaptar o site do TRT24	O desenvolvimento dos webservices foi concluído. Aguardando definição de data da migração

ID	Demandas oriundas da revisão do Portfólio	Situação atual
N20	Capacitar os gerentes e técnicos de TIC	Todos os gerentes e técnicos já receberam pelo menos 1 treinamento.
N21	Implantar a política de segurança da internet	Já foram realizados vários testes técnicos de ferramentas e mecanismos para controle e segurança. A minuta da política está em fase de elaboração.
N22	Implantar o escritório de métricas de software	2 servidores foram treinados da técnica de pontos de função. O processo de trabalho está em fase de elaboração.
N23	Instalar link de internet redundante	O TR já foi entregue e o processo está em fase de instrução no SMP.
N24	Instalar os novos servidores do interior	Os servidores já foram preparados e estão prontos para a distribuição.
N25	Reestruturar o site backup	O projeto de engenharia civil está em fase de elaboração. Já solicitamos a migração do link de internet e o orçamento do moving dos cofres.
N26	Migrar o sistema de Folha de Pagamentos para Java	O projeto está aguardando a conclusão da implantação do SGRHWeb.
N27	Aprimorar o sistema eVoto (planilha de votação eletrônica para processos administrativos)	O sistema tinha planilha de votação eletrônica somente para processos judiciais. O desenvolvimento da nova funcionalidade está em fase de testes e implantação.
N28	Informatizar rotinas de trabalho da SGP	O projeto está em fase de levantamento de requisitos.
N29	Substituir o boletim estatístico de 1º grau	Em fase de revisão das regras.
N30	Substituir o boletim estatístico de 2º grau	Em fase de revisão das regras.
N31	Atualizar o layout do site do TRT24	O Comitê Gestor do Site Oficial foi recentemente instituído e está começando a estabelecer os requisitos do novo layout.
N32	Implantar emissão de boletos para guias de pagamento - CEF	A CEF ainda não ofereceu o serviço.
N33	Desenvolver sistema para Gabinete de Saúde	Os levantamentos iniciais estão sendo refeitos. O programador foi substituído.
N34	Desenvolver aplicativos para internet móvel	Ainda em fase de teste de tecnologias para definir a melhor abordagem.
N35	Implantar rede	Em fase de pesquisa de tecnologias. Está sendo

wireless	realizado POC com o fornecedor xxxx. TR em fase de elaboração.
----------	--

O diagnóstico de pessoal, neste documento, consiste em relacionar a formação e competência, somente dos funcionários do quadro, para viabilizar a identificação das necessidades de recursos humanos e de capacitação da Área de TI.

Tabela de diagnóstico de pessoal

Lista de recursos para gestão/operação

		Habilidade	Área De Atuação
1	Alessander Monteiro Silva	Gestão e operação	Rede, Bd, Aplicações
2	Elthon Darvin Miranda Ratier	Gestão e operação	Governança
3	Emmanuel Sócio Magalhães	Operação	Atendimento
4	Everson França Cruz	Operação	Infraestrutura
5	Gleison Amaral Dos Santos	Gestão e operação	Suporte, Segurança e Governança
6	Hélio Teixeira	Operação	Infraestrutura
7	João Carlos Ferreira Filho	Gestão	Diretoria E Governança
8	Márcio Luiz Loureiro Euquério	Operação	Rede, Aplicações
9	Marcos Ribeiro Mendes Martins	Operação	Atendimento
10	Mauro Márcio Sakai	Gestão e operação	Rede, Bd, Aplicações
11	Norberto Paiva Valiente	Operação	Atendimento Gráfico
12	Pedro Villegas Araujo	Operação	Atendimento
13	Rodrigo Vianna Speller	Operação	Atendimento Foro
14	Sandra Corrêa Da Rosa	Operação	Secretária

Lista de recursos para desenvolvimento de software

		Habilidade	Sistemas de atuação
1	Aise Maria Longhi Canéppele	Delphi	Gestore, GestorePAE, Actu, eVoto, Protos, Usuários
2	Breno Hirokazu Nakamura Ribeiro	Java	eGestao1, eGestao2, internet, intranet, SRDT
3	Crisostomo Kolling	Delphi	Gestore, GestorePAE, Actu, eVoto, Judice2
4	Danielle Leite Da Silva	Delphi e Java	SRH, SRHWeb, Folha
5	Fabiano Ricardo De Oliveira Bellesia	Java	SMP, eGestão1 e eGestão2
6	Leandro Higa do Canto	Java	SRhWeb
7	Luís Fernando Petraca	Delphi e Java	SRH, SRHweb, Folha, Cálculo
8	Marco Antonio Ribeiro Molento	Delphi	Judice, Judice2, eGestao1, eGestao2
9	Marlon Leite De Albuquerque	Delphi	Judice, eGestão1 e eGestão2
10	Maycon José Cancini De Souza	Java	GestorePAE, SRHWeb
11	Rodrigo Marciano Pouso	Java	Internet, intranet e SRHWeb
12	Victor Gibin Scarpellini	Java	Internet, intranet e

			GestorePAE
13	Vismar Da Silva Cuellar	Delphi	Juris, Judice2, eGestão1 e eGestão2
14	Waldeci Leitun De Almeida	Java	Internet, intranet, SRDT e Judice2

Lista de recursos humanos X demandas

Desenvolvimento de software			
Servidores		Demandas	
Aise Maria Longhi Canéppele	N20	Capacitar gerentes e técnicos	
	N27	Aprimorar o sistema eVoto	
	N15	Aprimorar o sistema GestorePAE/GestoreWeb	
	N22	Implantar escritório de métricas de software	
	N28	Informatizar rotinas de trabalho da SGP	
Breno Hirokazu N. Ribeiro	N29	Substituir BE de 1º Grau	
	N30	Substituir BE de 2º Grau	
Crisostomo Kolling	N34	Desenvolver aplicativos para internet móvel	
	N27	Aprimorar o sistema eVoto	
	N15	Aprimorar o sistema GestorePAe/GestoreWeb	
	N28	Informatização da SGP	
Danielle Leite Da Silva	N26	Migrar o sistema de Folha de Pagamentos para Java	
	N16	Aprimorar o sistema SGRHWeb	
	N28	Informatização da SGP	
Fabiano R. de O. Bellesia	N33	Desenvolver sistema para Gab. De Saúde	
Leandro Higa do Canto	N33	Desenvolver sistema para Gab. De Saúde	
	N26	Migrar o sistema de Folha de Pagamentos para Java	
	N16	Aprimorar o sistema SGRHWeb	
	N28	Informatização da SGP	
Luís Fernando Petraca	N26	Migrar o sistema de Folha de Pagamentos para Java	
	N16	Aprimorar o sistema SGRHWeb	
Marco Antonio R. Molento	N29	Substituir BE de 1º Grau	
	N30	Substituir BE de 2º Grau	
Marlon L. de Albuquerque	N29	Substituir BE de 1º Grau	
	N30	Substituir BE de 2º Grau	
Maycon José C. De Souza	N15	Aprimorar o sistema GestorePAe/GestoreWeb	
	N28	Informatização da SGP	
Rodrigo Marciano Pouso	N9	Implantar o sistema PJe	
	N15	Aprimorar o sistema GestorePAe/GestoreWeb	
	N28	Informatização da SGP	
Victor Gibin Scarpellini	N31	Atualizar o layout do site do TRT24	
Vismar Da Silva Cuellar	N9	Implantar o sistema PJe	

Waldeci Leitun De Almeida	N31	Atualizar o layout do site do TRT24
	N32	Implantar emissão de boletos para CEF
	N22	Implantar escritório de métricas de software

Infraestrutura		
Servidor	Novas demandas	
Alessander Monteiro Silva	N7	Instalar salas técnicas nas varas do interior
	N24	Instalar os novos servidores do interior
	N25	Reestruturar o site backup
	N23	Instalar link de internet redundante
	N21	Implantar a política de segurança da internet
	N35	Implantar rede wireless
Erick Takahashi	N24	Instalar os novos servidores do interior
	N25	Reestruturar o site backup
Gleison Amaral Dos Santos	N25	Reestruturar o site backup
	N23	Instalar link de internet redundante
	N21	Implantar a política de segurança da internet
Márcio Luiz Loureiro Euquério	N24	Instalar os novos servidores do interior
	N25	Reestruturar o site backup
Mauro Márcio Sakai	N9	Implantar o sistema PJe
	N25	Reestruturar o site backup

Governança		
Servidor	Novas demandas	
Elthon Darvin Miranda Ratier	N1	Implantar os processos P01, P10, DS4 e DS8
	N2	Implantar os processos ITIL v3
Emmanuel Socio Magalhães	N1	Implantar os processos P01, P10, DS4 e DS8
	N2	Implantar os processos ITIL v3
	N8	Renovar 1/3 dos computadores das varas
Everson França Cruz	N2	Implantar os processos ITIL v3
Hélio Teixeira	N2	Implantar os processos ITIL v3
	N7	Instalar salas técnicas nas varas do interior
	N8	Renovar 1/3 dos computadores das varas
	N9	Implantar o sistema PJe
Marcos Ribeiro Mendes Martins	N2	Implantar os processos ITIL v3
Pedro Villegas Araújo	N2	Implantar os processos ITIL v3
	N9	Implantar o sistema PJe
Rodrigo Vianna Speller	N2	Implantar os processos ITIL v3

Gráfico de cruzamento de demandas X pessoas





Gráfico de cruzamento de demandas operacionais x pessoas

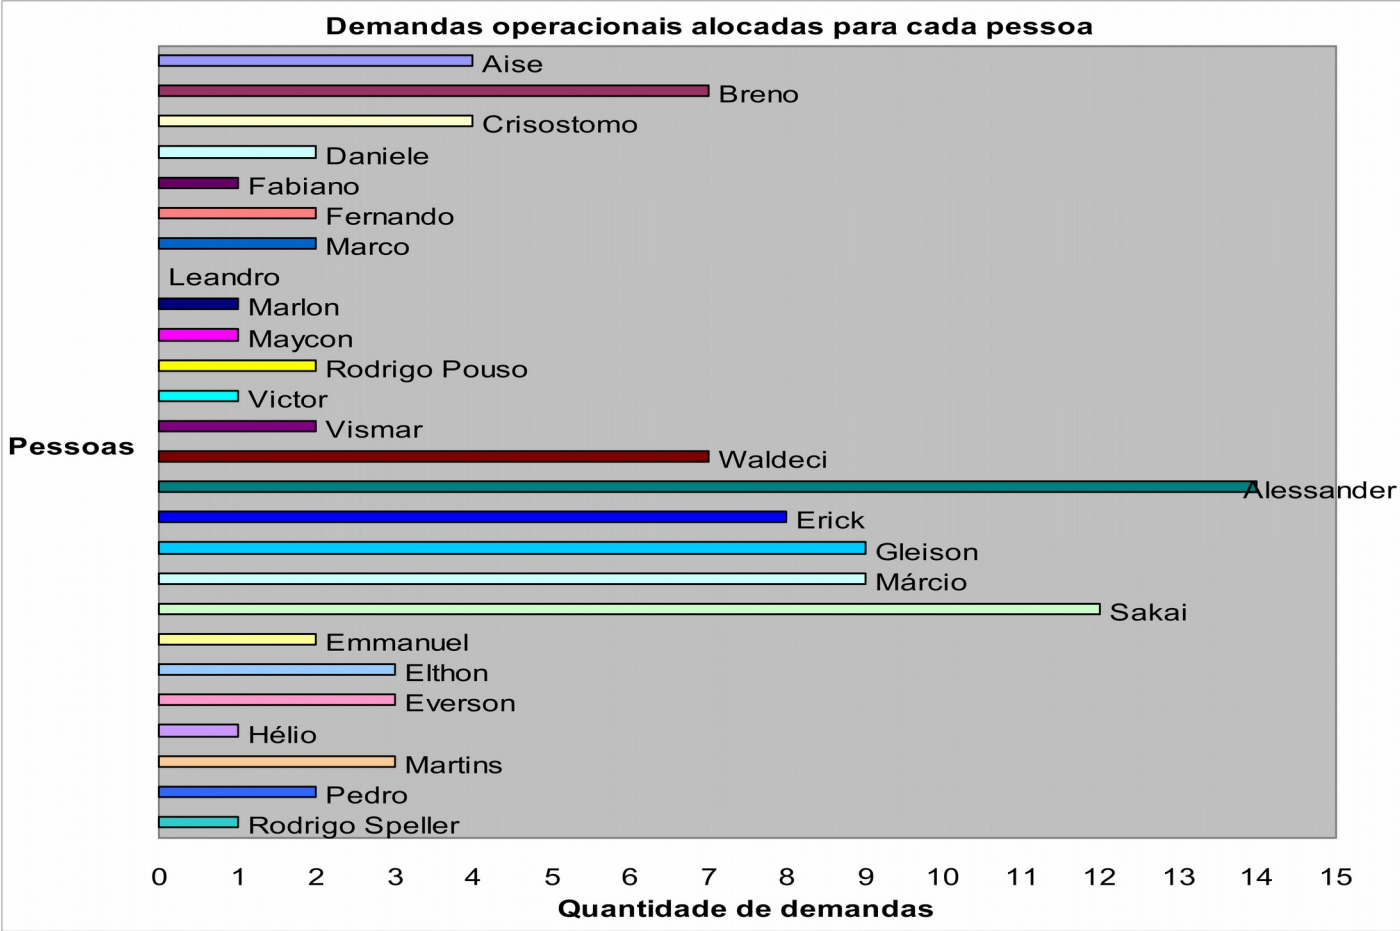

Planejamento das ações

O planejamento das ações, neste documento, parte do diagnóstico das necessidades e relaciona as ações que deverão ser tomadas, com definição de prioridades.

Planejamento das ações

Necessidade: N1	Governança de TI	
Implantar o processo COBIT P01		
Objetivo	Ações	Id
Atingir nível de maturidade 3	Realizar RAEs	1.1
	Executar ciclo completo do processo	1.2
Necessidade: N2	Governança de TI	
Implantar os processos de suporte a serviços da biblioteca ITIL v3		
Objetivo	Ações	Id
Gerenciamento de liberação	Mapear o processo, definir política e implantar sistema de controle de liberação	2.1
Gerenciamento de fornecedor	Mapear o processo, definir política e implantar sistema de controle de fornecedor	2.2
Necessidade: N20 (N3 e N6)	Governança de TI	
Capacitar os gerentes e técnicos de TIC		
Objetivo	Ações	Id
Realizar capacitações	Elaborar projeto	3.1
	Realizar treinamentos	3.2
Necessidade: N4	Governança de TI	
Contratar serviço de atendimento de 1º nível para a Central de Serviços e de atendimento de 1ª linha de hardware		
Objetivo	Ações	Id

Contratar o serviço	Elaborar o projeto	4.1
	Realizar a contratação	4.2
	Implantar o serviço	4.3
Necessidade: N7	Infraestrutura	
Instalar salas técnicas nas varas do interior		
Objetivo	Ações	Id
Implantar salas técnicas apropriadas em 4 varas do interior	Conferir projetos de construção em andamento	7.1
	Instalar sensores de ambiente	7.2
Necessidade: N8	Infraestrutura	
Renovar anualmente 1/3 do parque de equipamentos		
Objetivo	Ações	Id
Substituir aproximadamente 300 estações de trabalho	Elaborar minuta de termo de referência	8.1
	Realizar a aquisição	8.2
	Distribuir os equipamentos	8.3
Necessidade: N9	Desenvolvimento de software	
Implantar o sistema de processo judicial eletrônico		
Objetivo	Ações	Id
Implantar o PJe em 10 varas do trabalho	Instalar computadores nas varas	9.1
	Instalar infraestrutura básica	9.2
Necessidade: N15	Desenvolvimento de software	
Aprimorar o sistema de processo administrativo eletrônico		
Objetivo	Ações	Id
Desenvolver melhorias	Fazer levantamento de feedback	15.1
	Desenvolver funcionalidades	15.2

Necessidade: N19	Desenvolvimento de software	
Implantar o serviço de emissão de boletos para guias de pagamento - Banco do Brasil		
Objetivo	Ações	Id
Implantar o novo serviço	Definir data da migração	19.1
	Informar os clientes	19.2
Necessidade: N21	Governança de TI	
Implantar a política de segurança da internet		
Objetivo	Ações	Id
Oficializar a política de controle de acesso a conteúdo web	Testar mecanismos de controle	21.1
	Elaborar minuta da política	21.2
	Implantar controles	21.3
Necessidade: N22	Desenvolvimento de software	
Implantar escritório de métricas de software		
Objetivo	Ações	Id
Estabelecer processo de contagem de produtividade de software	Definir o processo de contagem	22.1
	Implantar o processo em sistema piloto	22.2
Necessidade: N23	Infraestrutura	
Instalar link de internet redundante		
Objetivo	Ações	Id
Garantir disponibilidade de acesso e aumentar largura da banda de conexão de internet	Definir especificação	23.1
	Elaborar TR	23.2
	Contratar	23.3
Necessidade: N24	Infraestrutura	
Instalar os novos servidores do interior		
Objetivo	Ações	Id
Atualizar os equipamentos	Preparar os equipamentos (configurar)	24.1
	Distribuir nas varas do interior	24.2

Necessidade: N25	Infraestrutura	
Reestruturar o site backup		
Objetivo	Ações	Id
Aumentar a tolerância a falhas e a segurança da informação	Elaborar projeto	25.1
	Fazer moving dos equipamentos	25.2
Necessidade: N26	Desenvolvimento de software	
Migrar o sistema de Folha de Pagamentos para Java		
Objetivo	Ações	Id
Atualizar a tecnologia e melhorar o tempo de resposta	Elaborar projeto	26.1
	Implementar	26.2
	Implantar	26.3
Necessidade: N27	Desenvolvimento de software	
Aprimorar o sistema Evoto		
Objetivo	Ações	Id
Desenvolver funcionalidades para as sessões administrativas	Elaborar projeto	27.1
	Implementar	27.2
	Implantar	27.3
Necessidade: N28	Desenvolvimento de software	
Informatizar as rotinas de trabalho da SGP		
Objetivo	Ações	Id
Integrar as rotinas da SGP ao sistema de gestão de processos administrativos e ao sistema de recursos humanos.	Elaborar projeto	28.1
	Implementar	28.2
	Implantar	28.3
Necessidade: N29	Desenvolvimento de software	
Substituir o BE de 1º grau		
Objetivo	Ações	Id
Revisar as regras implementadas para melhorar a qualidade dos dados	Revisar regras	29.1
	Implementar acertos	29.2

Necessidade: N30	Desenvolvimento de software	
Substituir o BE de 2º grau		
Objetivo	Ações	Id
Revisar as regras implementadas para melhorar a qualidade dos dados	Revisar regras	30.1
	Implementar acertos	30.2
Necessidade: N31	Desenvolvimento de software	
Atualizar o layout do site do TRT24		
Objetivo	Ações	Id
Renovar a programação visual	Implantar Comitê Gestor	31.1
	Levantar requisitos	31.2
	Elaborar projeto	31.3
	Implementar	31.4
	Implantar	31.5
Necessidade: N32	Desenvolvimento de software	
Implantar a emissão de boletos para guias de pagamentos da CEF		
Objetivo	Ações	Id
Implantar a emissão de boletos para guias de pagamentos da CEF	Elaborar projeto	32.1
	Implementar	32.2
	Implantar	32.3
Necessidade: N33	Desenvolvimento de software	
Desenvolver sistema para o Gabinete de Saúde		
Objetivo	Ações	Id
Informatizar as rotinas de trabalho	Elaborar projeto	33.1
	Implementar	33.2
	Implantar	33.3
Necessidade: N34	Desenvolvimento de software	
Desenvolver aplicativos para internet móvel		
Objetivo	Ações	Id
Oferecer aos clientes novos meios de acesso ao conteúdo	Elaborar projeto	34.1

de informações produzido pelo TRT24	Implementar	34.2
	Implantar	34.3
Necessidade: N35	Desenvolvimento de software	
Implantar rede wireless		
Objetivo	Ações	Id
Implantar acesso a rede sem fio nos prédios da capital e nas varas do interior	Fazer pesquisa de mercado	35.1
	Realizar POC de tecnologia	35.2
	Elaborar TR	35.3
	Adquirir solução	35.4
	Implantar	35.5

Planejamento da execução

O planejamento da execução, neste documento, consiste em identificar os recursos humanos e orçamentários necessários para a realização das ações planejadas para o atendimento das necessidades, bem como estimar os prazos para início e conclusão das ações.

Planejamento da Execução

Implantar o processo COBIT P01	Id	Prazos		Recursos	
		Início	Conclusão	Humanos	Orçamentários
Ações					
Realizar RAEs	1.1	Fev/2012	Dez/2013	CGTIC	Não se aplica
Executar ciclo completo do processo	1.2	Fev/2012	Dez/2013	CGTIC	Não se aplica
Implantar os processos de suporte a serviços da biblioteca ITIL v3					
Ações	Id				
Mapear o processo, definir política e implantar sistema de controle de liberação	2.1	Jan/2012	Dez/2013	DGTI	Não se aplica
Mapear o processo, definir política e implantar sistema de controle de fornecedor	2.2	Jan/2012	Dez/2013	DGTI	Não se aplica
Capacitar os gerentes e técnicos de TIC					
Ações	Id				
Elaborar projeto	3.1	Jan/2012	Dez/2013	Diretoria	Não se aplica
Realizar treinamentos	3.2	Jan/2012	Dez/2013		R\$100.000,00
Contratar serviço de atendimento de 1º nível para a Central de Serviços e de atendimento de 1ª linha de hardware					
Ações	Id				
Elaborar o projeto	4.1	Jan/2012	abril/2013	DGTI	Não se aplica
Realizar a contratação	4.2	abril/2013	Set/2013	Diretoria	R\$200.000,00
Implantar o serviço	4.3	Out/2013	Dez/2013	DGTI	Não se aplica
Instalar salas técnicas nas varas do interior					
Ações	Id				
Conferir projetos de construção em andamento	7.1	Jan/2013	Jan/2013	DSS	Não se aplica
Instalar sensores de ambiente	7.2	Jan/2013	Jun/2013	DSS	R\$60.000,00

Renovar anualmente 1/3 do parque de equipamentos					
Ações	Id				
Elaborar minuta de termo de referência	8.1	Jan/2012	Fev/2013	DSS	Não se aplica
Realizar a aquisição	8.2	Jan/2012	Out/2013	Diretoria	R\$660.000,00
Distribuir os equipamentos	8.3	Out/2012	Dez/2013	DGTI	Não se aplica
Implantar o sistema de processo judicial eletrônico					
Ações	Id				
Instalar computadores nas varas	9.1	Jun/2012	Set/2013	DGTI	Não se aplica
Instalar infraestrutura básica	9.2	Jun/2012	Set/2013	DGTI	Não se aplica
Aprimorar o sistema de processo administrativo eletrônico					
Ações	Id				
Fazer levantamento de feedback	15.1	Out/2012	Jan/2013	DSI	Não se aplica
Desenvolver funcionalidades	15.2	Jan/2013	Dez/2013	DSI	Não se aplica
Implantar o serviço de emissão de boletos para guias de pagamento - Banco do Brasil					
Ações	Id				
Definir data da migração	19.1	Mai/2013	Mai/2013	Diretoria	Não se aplica
Informar os clientes	19.2	Mai/2013	Mai/2013	DGTI e DSI	Não se aplica
Implantar a política de segurança da internet					
Ações	Id				
Testar mecanismos de controle	21.1	fev/2013	Jun/2013	DSS	Não se aplica
Elaborar minuta da política	21.2	Jun/2013	Jun/2013	Diretoria	Não se aplica
Implantar controles	21.3	Jun/2013	Jun/2013	DSS	Não se aplica
Implantar escritório de métricas de software					
Ações	Id				
Definir o processo de contagem	22.1	Out/2012	Jun/2013	DSI	Não se aplica
Implantar o processo em sistema piloto	22.2	Jun/2013	Dez/2013	DSI	Não se aplica
Instalar link de internet redundante					
Ações	Id				
Definir especificação	23.1	Jan/2013	Jan/2013	DSS	Não se aplica
Elaborar TR	23.2	Fev/2013	Fev/2013	DSS	Não se aplica
Contratar	23.3	Fev/2013	Jun/2013	Diretoria	R\$96.000,00
Instalar os novos servidores do interior					

Ações	Id				
Preparar os equipamentos (configurar)	24.1	Jan/2013	Mar/2013	DSS	Não se aplica
Distribuir nas varas do interior	24.2	Mar/2013	Jun/2013	DSS	Não se aplica
Reestruturar o site backup					
Ações	Id				
Elaborar projeto	25.1	Jan/2013	Mar/2013	DSS	Não se aplica
Fazer moving dos equipamentos	25.2	Abril/2013	Mai/2013	DSS	Não se aplica
Migrar o sistema de Folha de Pagamentos para Java					
Ações	Id				
Elaborar projeto	26.1	Jan/2013	Fev/2013	DSI	Não se aplica
Implementar	26.2	Julho/2013	Dez/2013	DSI	Não se aplica
Implantar	26.3	Dez/2013	Dez/2013	DSI	Não se aplica
Aprimorar o sistema Evoto					
Ações	Id				
Elaborar projeto	27.1	Jan/2013	Fev/2013	DSI	Não se aplica
Implementar	27.2	Fev/2013	Mar/2013	DSI	Não se aplica
Implantar	27.3	Abril/2013	Abril/2013	DSI	Não se aplica
Informatizar as rotinas de trabalho da SGP					
Ações	Id				
Elaborar projeto	28.1	Jun/2013	Jun/2013	DSI	Não se aplica
Implementar	28.2	Jun/2013	Out/2013	DSI	Não se aplica
Implantar	28.3	Out/2013	Dez/2013	DSI	Não se aplica
Substituir o BE de 1º grau					
Ações	Id				
Revisar regras	29.1	Jan/2013	Dez/2013	DSI	Não se aplica
Implementar acertos	29.2	Jan/2013	Dez/2013	DSI	Não se aplica
Substituir o BE de 2º grau					
Ações	Id				
Revisar regras	30.1	Jan/2013	Dez/2013	DSI	Não se aplica
Implementar acertos	30.2	Jan/2013	Dez/2013	DSI	Não se aplica
Atualizar o layout do site do TRT24					
Ações	Id				
Implantar Comitê Gestor	31.1	Jan/2013	Fev/2013	DSI	Não se aplica
Levantar requisitos	31.2	Fev/2013	Mai/2013	DSI	Não se aplica

Elaborar projeto	31.3	Mai/2013	Jun/2013	DSI	Não se aplica
Implementar	31.4	Jun/2013	Out/2013	DSI	Não se aplica
Implantar	31.5	Out/2013	Dez/2013	DSI	Não se aplica
Implantar a emissão de boletos para guias de pagamentos da CEF					
Ações	Id				
Elaborar projeto	32.1	Jan/2013	Fev/2013	DSI	Não se aplica
Implementar	32.2	Fev/2013	Mai/2013	DSI	Não se aplica
Implantar	32.3	Mai/2013	Jun/2013	DSI	Não se aplica
Desenvolver sistema para o Gabinete de Saúde					
Ações	Id				
Elaborar projeto	33.1	Fev/2013	Mai/2013	DSI	Não se aplica
Implementar	33.2	Mai/2013	Set/2013	DSI	Não se aplica
Implantar	33.3	Set/2013	Dez/2013	DSI	Não se aplica
Desenvolver aplicativos para internet móvel					
Ações	Id				
Elaborar projeto	34.1	Mai/2013	Junho/2013	DSI	Não se aplica
Implementar	34.2	Junho/2013	Ag/2013	DSI	Não se aplica
Implantar	34.3	Ag/2013	Ag/2013	DSI	Não se aplica
Implantar rede wireless					
Ações	Id				
Fazer pesquisa de mercado	35.1	Jan/2013	Junho/2013	DSS	Não se aplica
Realizar POC de tecnologia	35.2	Jan/2013	Junho/2013	DSS	Não se aplica
Elaborar TR	35.3	Jan/2013	Junho/2013	DSS	Não se aplica
Adquirir solução	35.4	Junho/2013	Ago/2013	DSS	R\$250.000,00
Implantar	35.5	Set/2013	Dez/2013	DSS	Não se aplica
